

**Благоустройство дворовой территории по адресу:
город Оленегорск, по ул. Пионерская, д. № 12**

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332, от 29.12.2021 № 864, от 22.02.2022 № 125, от 23.03.2022 № 219, от 08.04.2022 № 293).

Общая стоимость работ – 6 299 662 (Шесть миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 72 копейки.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 5 984 679,58 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 314 983,14 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ООО «Страда СРО»

ИНН 5101312446


Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Вид работ – ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней, устройство тротуаров и автомобильных парковок для стоянок автомобилей.

До начала работ






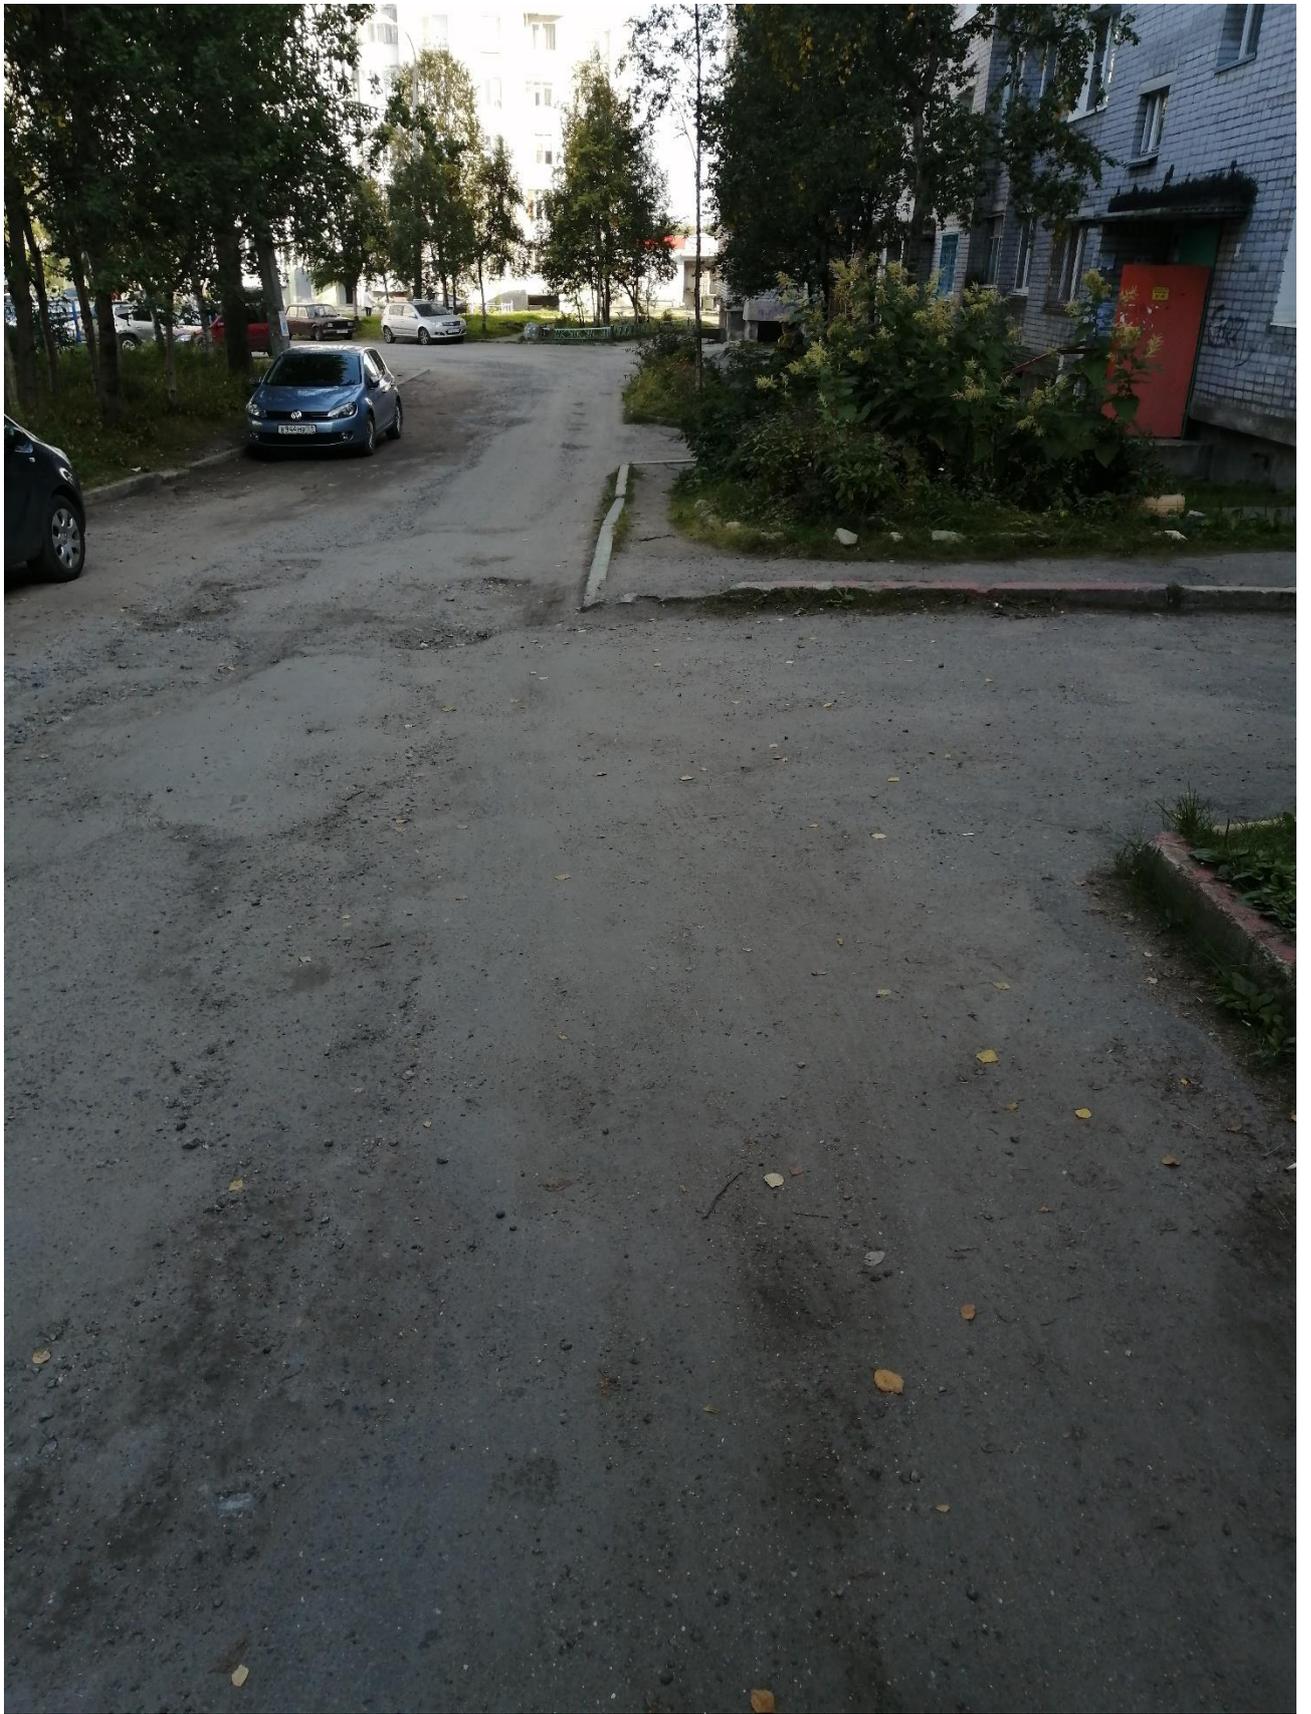


По состоянию на 24.06.2022 на объекте:

- произведены работы по разборке существующих бортовых камней;
- ведутся работы по разработке траншей для устройства новых бортовых камней.

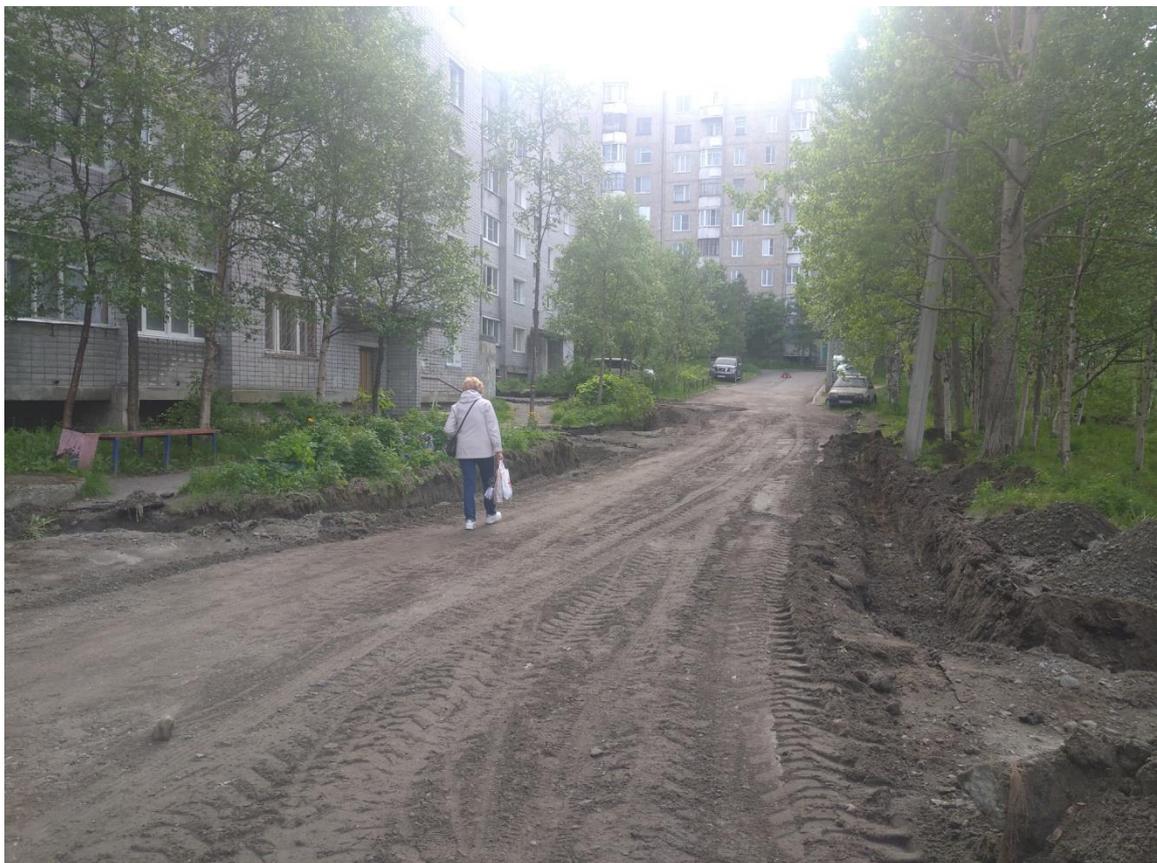

По состоянию на 07.07.2022 на объекте:

- **завершены работы по разработке траншей для устройства новых бортовых камней;**
- **на объект доставлены материалы для дальнейшего производства работ.**

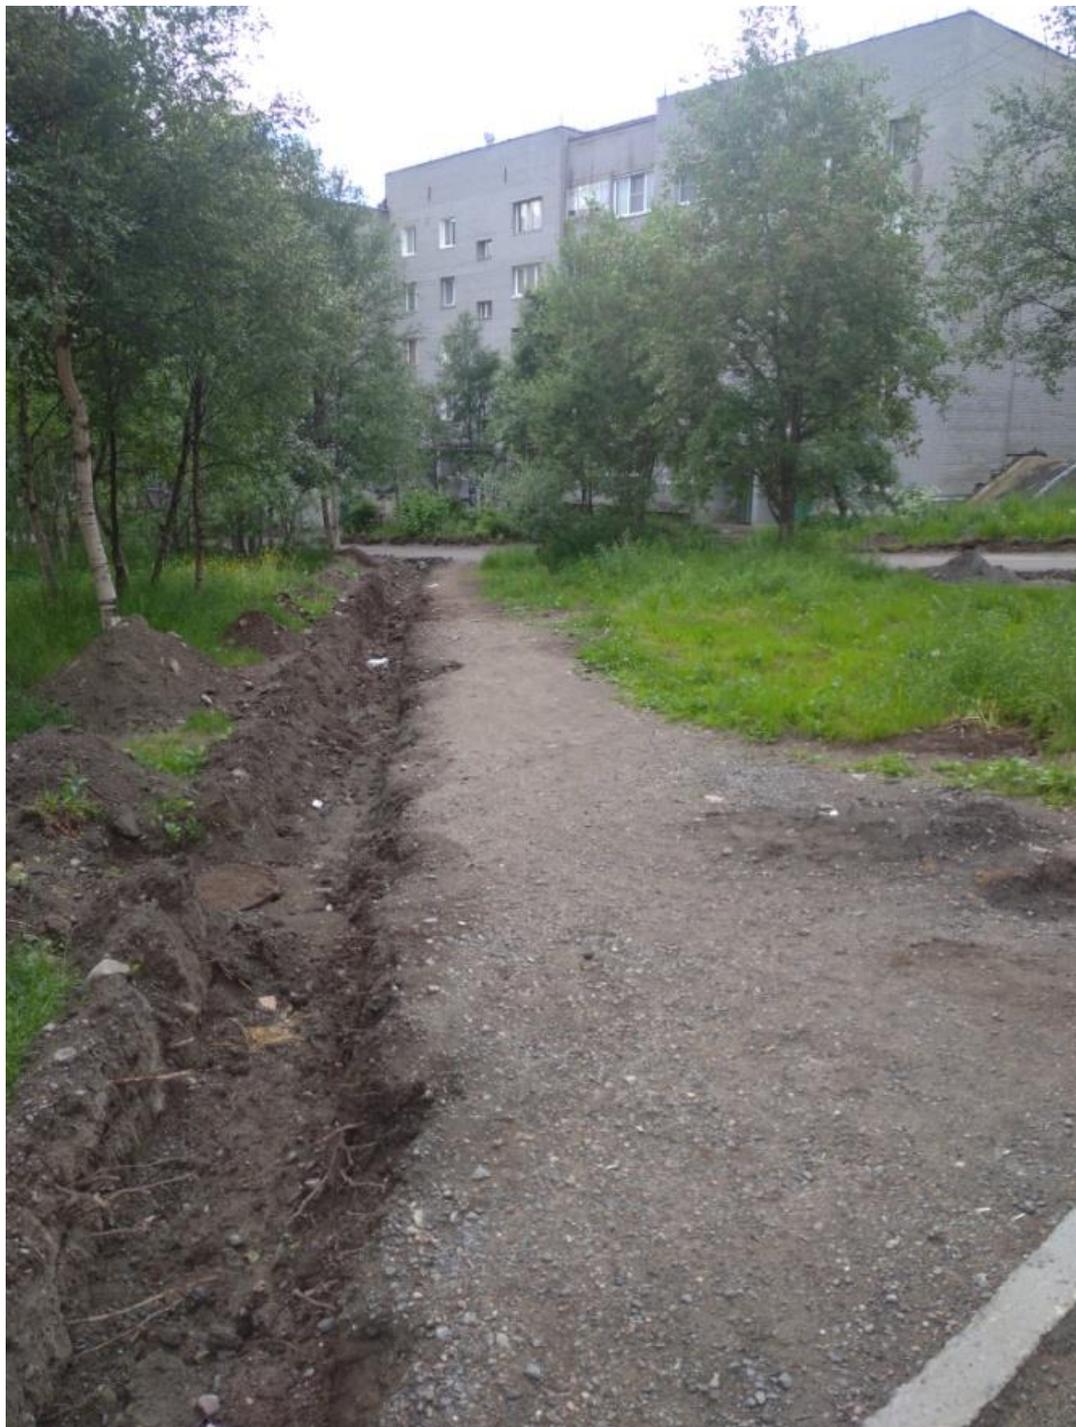



По состоянию на 21.07.2022 на объекте:

- ведутся работы по устройству оснований под бортовые камни и установке новых бортовых камней.






По состоянию на 27.07.2022 на объекте:

- продолжаются работы по установке бортовых камней;**
- выполняются работы по замене люков колодцев и камер.**




По состоянию на 04.08.2022 на объекте:

- завершаются работы по установке бортовых камней;
- продолжаются работы по замене люков колодцев и камер;
- приступили к устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня.

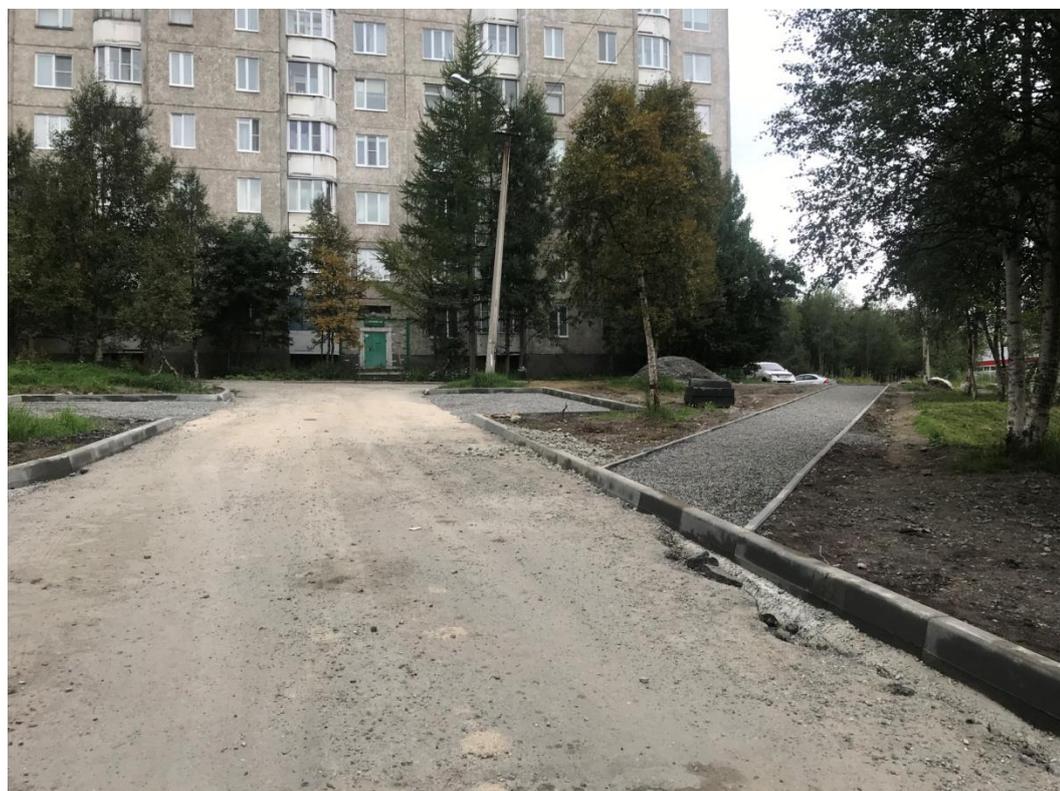

По состоянию на 11.08.2022 на объекте:

- завершаются работы по замене люков колодцев и камер;
- ведутся работы по обратной засыпке пазух у бортового камня;
- продолжаются работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня.

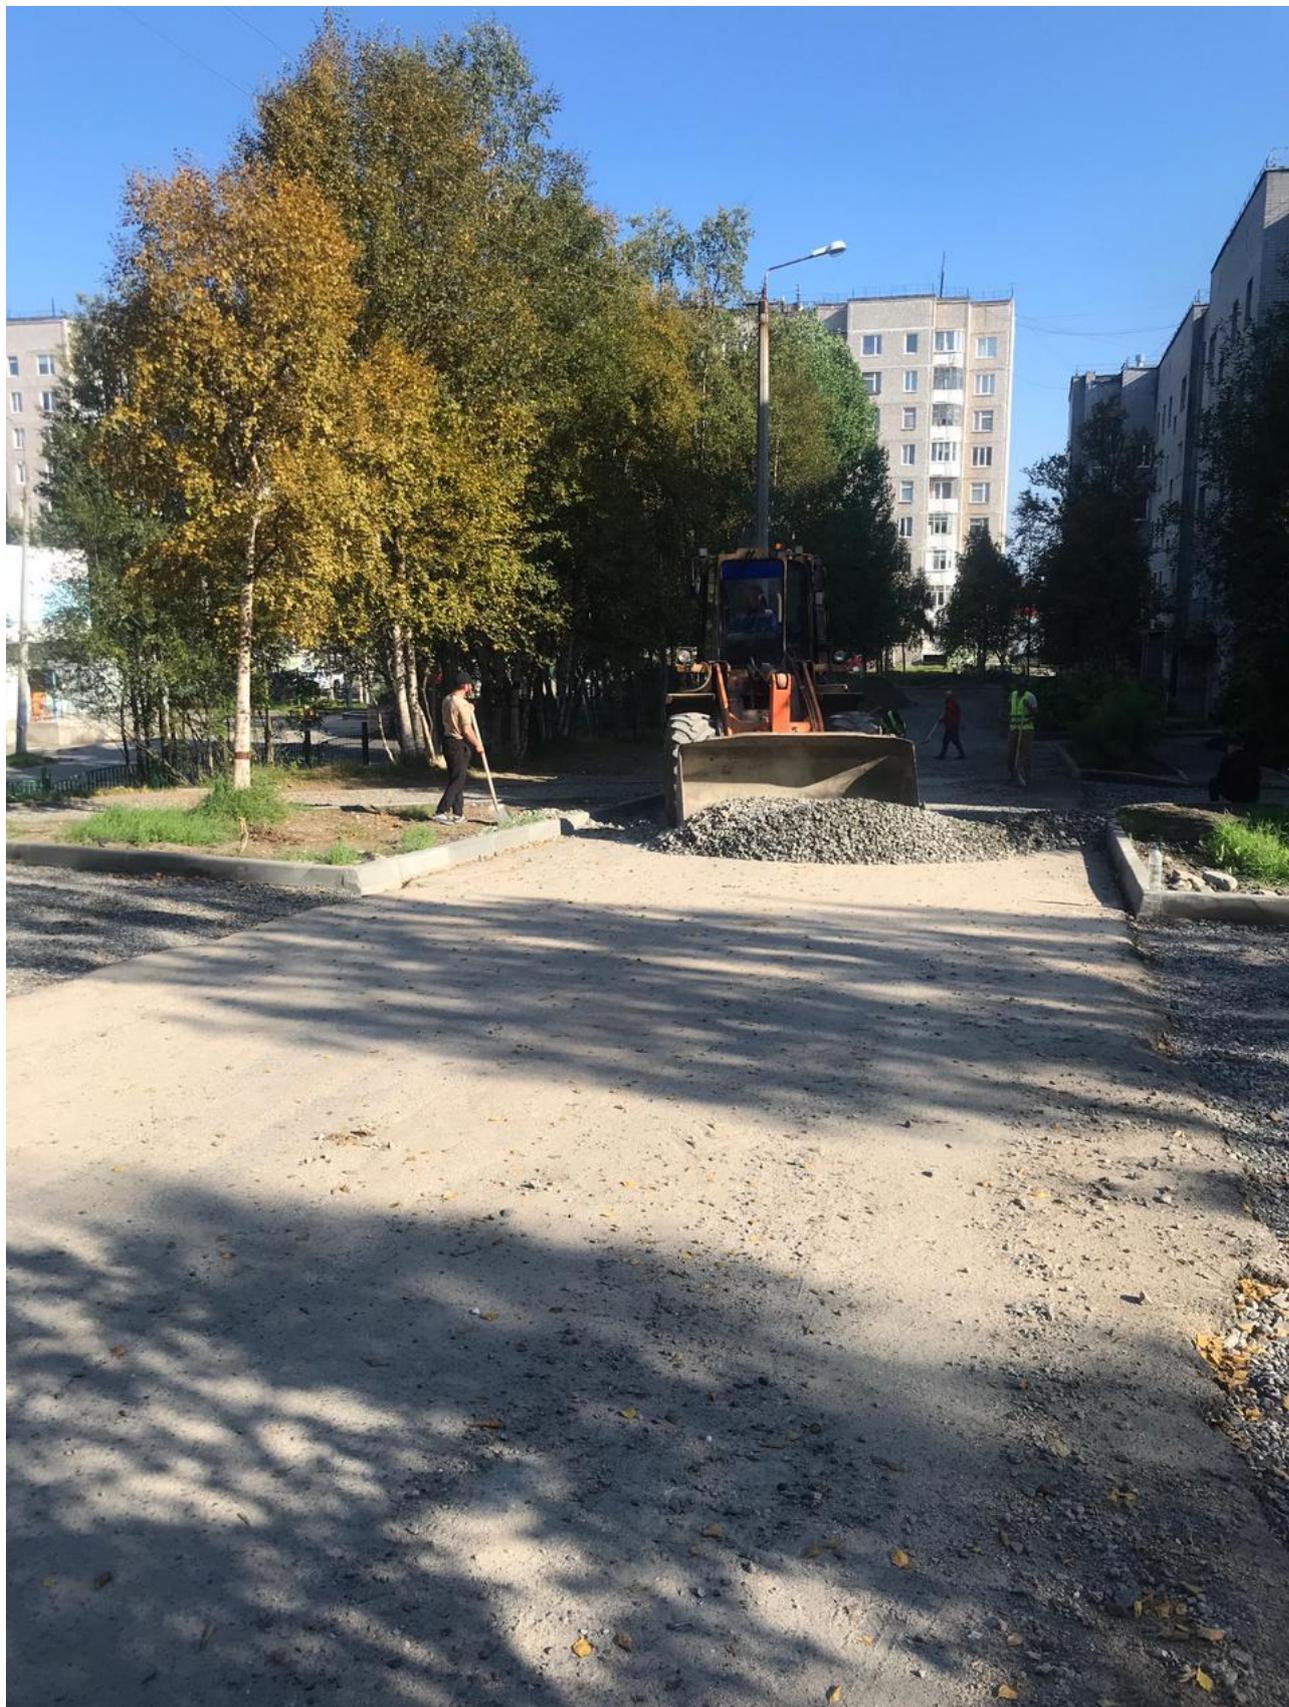


По состоянию на 19.08.2022 на объекте:

- завершаются работы по замене люков колодцев и камер;
- продолжаются работы по обратной засыпке пазух у бортового камня;
- завершаются работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.




По состоянию на 01.09.2022 на объекте:

- завершены работы по замене люков колодцев и камер, работы по обратной засыпке пазух у бортового камня и работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.

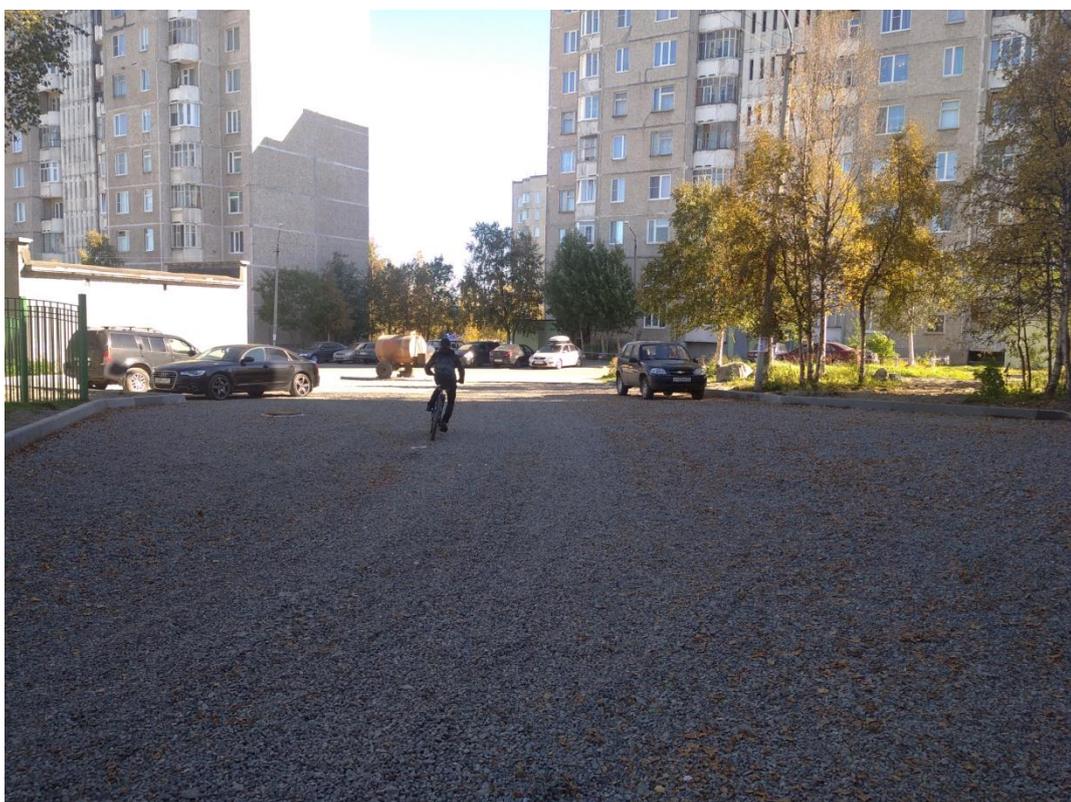

По состоянию на 08.09.2022 на объекте:

- ведутся работы по устройству асфальтобетонных покрытий.

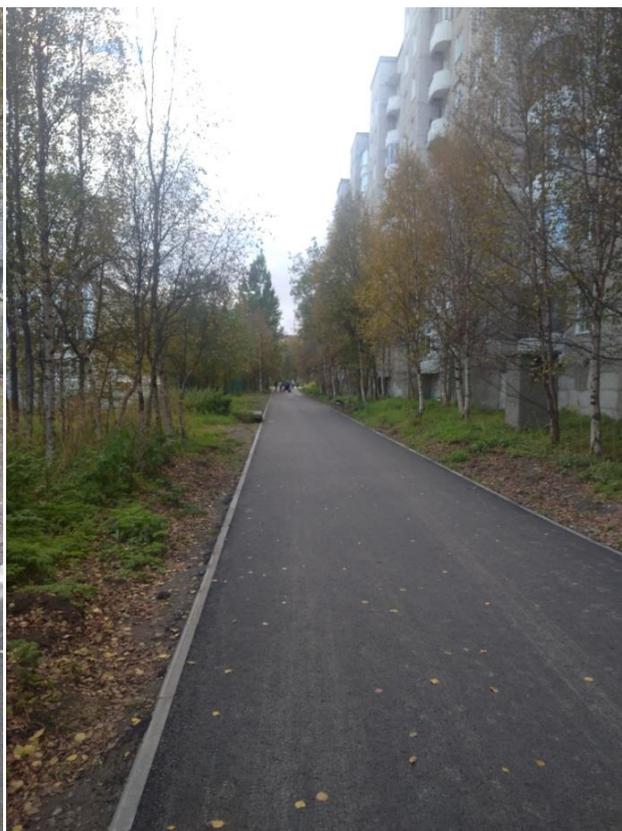

По состоянию на 15.09.2022 на объекте:

- завершены работы по устройству асфальтобетонных покрытий;**
- начаты работы по устройству шва-стыка в асфальтобетонном покрытии.**



По состоянию на 29.09.2022 на объекте:

- **завершены работы по устройству шва-стыка в асфальтобетонном покрытии;**
- **произведен вывоз техники и оборудования;**
- **приступили к уборке территории и вывозу мусора.**



По состоянию на 07.10.2022 работы завершены. Объект принят.



