

**Благоустройство территории культурно-досугового центра «Платформа» по адресу:
Мурманская область, Печенгский район, пгт. Печенга, Печенгское шоссе, д. 4а**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021-2025 годы» (утвержденное постановлением Администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 13.11.2019 №247, с изменениями от 06.04.2020 №54), в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области» (утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, с изменениями от 29.12.2017 № 651-ПП, от 21.03.2018 № 115-ПП, от 27.11.2018 № 550-ПП, от 29.03.2019 № 143-ПП).

Общая стоимость работ – 3 800 562,88 (Три миллиона восемьсот тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- федерального бюджета в сумме 3 233 599,97 рублей.
- регионального бюджета Мурманской области в сумме 206 400,03 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования городское поселение Печенга в сумме 360 562,88 рублей.

Заказчик: МБУ «Культурно-досуговый центр «Платформа».

Подрядчик: ООО «ПИТЕРСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» г. Санкт-Петербург.

ИНН 7813271585.


Срок выполнения работ: с 03.04.2020 по 31.07.2020.

Работами предусмотрено укладка брусчатки, установка ограждения, устройство трибун и сцены. Работы начаты 01.06.2020 и завершены 31.07.2020.

По состоянию на 26.05.2020:




По состоянию на 25.06.2020:

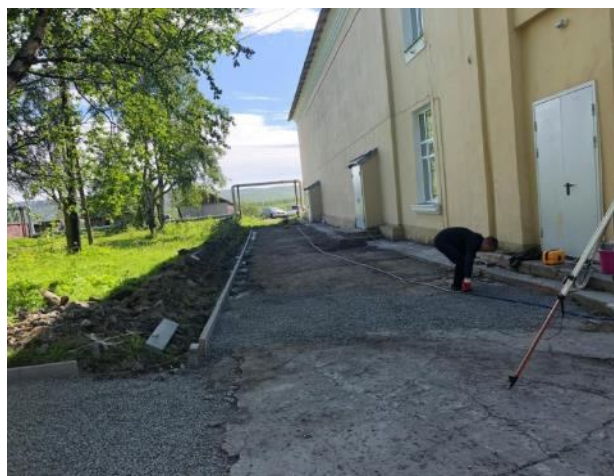

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев.

По состоянию 15.07.2020:

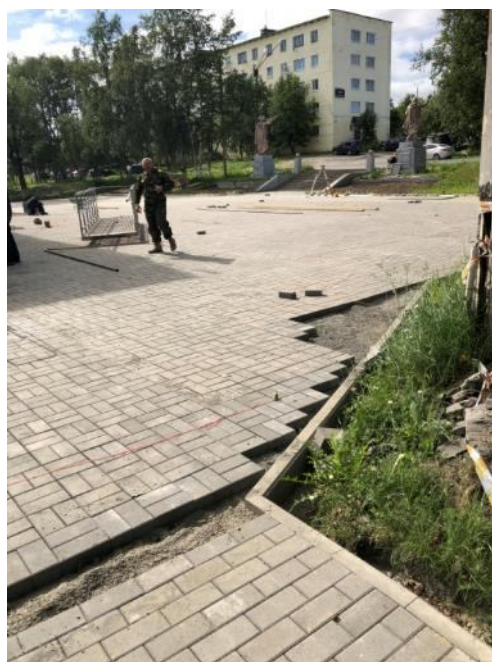

Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою.

По состоянию на 22.07.2020:



Монтаж трибун и сцены.

По состоянию на 24.07.2020:



Устройство ограждения и деревянного короба.

По состоянию на 28.07.2020:



Устройство ступеней и пандуса.

По состоянию на 31.07.2020:

Работы завершены.

